



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies de Catalunya



adif



Rodalies
de Catalunya

renfe

EXECUCIÓ DEL PLA DE RODALIES 2022

Compareixença al Parlament de Catalunya 24/01/2023

OFICINA DE COORDINACIÓ DEL PLA DE RODALIES



1. Programa d'increment de capacitat i integració urbana

2. Programa d'actuacions a les estacions

3. Programa de reposició d'actius

4. Programa d'atenció al client

5. Programa de material rodant

6. Programa d'avaluació i planificació d'actuacions estructurants



Inversió del Pla de Rodalies

Inversions del Pla

2020-2025 ► 2.902,34 M€

2026-2030 ► 2.727,95 M€

5.630,29 M€

Actuacions immediates

4.622,39 M€

Actuacions a mig termini

1.164 M€

Altres actuacions a Rodalies

559,53 M€



Inversió total a Rodalies

6.345,92 M€



Programa d'increment de capacitat i integració urbana (1)

Actuació	Pressupost Pla de Rodalies M€	Pressupost en execució M€	Grau d'execució
Integració urbana a L'Hospitalet de Llobregat	726,1	4,32	Projecte
Integració urbana a Sant Feliu de Llobregat	103,91	72,59	En execució
Salt de moltó Aigües	*	0,71	Projecte
Integració urbana a Montcada	410	627,40	Licitat
Configuració 4+4 estació de Sants	7,04	7,40	En servei
Nou accés a l'Aeroport del Prat	126,05	93,79	En execució
Remodelació estació Montcada Bifurcació	61	1,23	Projecte
Remodelació integral estació Pl. Catalunya	20,57	0,90	Projecte
Remodelació estació Castelldefels	39	39,43	Licitat
Duplicació de via Parets-La Garriga	117	98,33	En execució
Duplicació de via tram Vic	4,20	5,08	Adjudicat

* pressupost inclòs a l'Integració urbana a Montcada



Programa d'increment de capacitat i integració urbana (2)

Actuació	Pressupost Pla de Rodalies M€	Pressupost en execució M€	Grau d'execució
Instal·lació ERTMS L'Hospitalet-Mataró	23,23	92,90	En execució
Instal·lació ERTMS Manresa-St. Vicenç de Calders	90,58	90,58	En execució
Instal·lació ERTMS L'Hospitalet-Nus Vila-seca	69,70	52,36	En execució
Plans d'acció contra el soroll	64,13	2,09	Projecte
Instal·lacions de telecomunicacions (GSM-R)	11,59	24,39	En execució
Ramal entre línia de Vic i del Vallès	4,84	0,11	El Adjudicat
Estació tècnica del Prat de Llobregat	19,36	0,11	El Adjudicat
Quadruplicació via Castelldefels-El Prat	80	-	Pendent
Via d'apartat a l'estació de Tordera	0,9	-	Pendent
Triplicació de via Montcada-Mollet Sant Fost	53	-	Pendent
Salt de moltó de Cerdanyola	6,90	0,11	El Adjudicat

Programa d'actuacions a les estacions

Adequació PMR i remodelació de les estacions

Sant Miquel de Gonerres	2,71 M€	En servei
Torre del Baró	1,35 M€	En servei
Cerdanyola – UAB	2,00 M€	En servei
Bellvitge	4,00 M€	En servei
Ocata	3,10 M€	En execució
Vacarisses-Torreblanca	2,90 M€	En execució
Molins de Rei	7,28 M€	En execució
Mollet Sant Fost	5,25 M€	En execució
Sant Vicenç de Castellet	5,52 M€	Pendent conveni
Llinars del Vallès	3,51 M€	Adjudicada
Palautordera	2,67 M€	Projecte

Noves estacions

Santa Perpètua de Mogoda	2,71 M€	En servei
Salou-Port Aventura	11,00 M€	En execució
Bellissens	4,86 M€	Projecte
Terrassa-Can Boada	10,89 M€	Adjudicat El

Rehabilitacions i remodelacions


Sant Andreu	31,3 M€	En servei
Coberta estació de França	4,36 M€	En execució
Accessibilitat andanes Sants	7,93 M€	En execució
Remodelació Vilafranca	2,99 M€	En execució
Edifici històric de Vic	0,32 M€	Acabada
Andanes 200 m Arc de Triomf	2,82 M€	Adjudicada

Programa de reposició d'actius

Previsió 2020-2025: 603,35 M€

Execució a 31 de octubre de 2022: 229,32,M€

38%

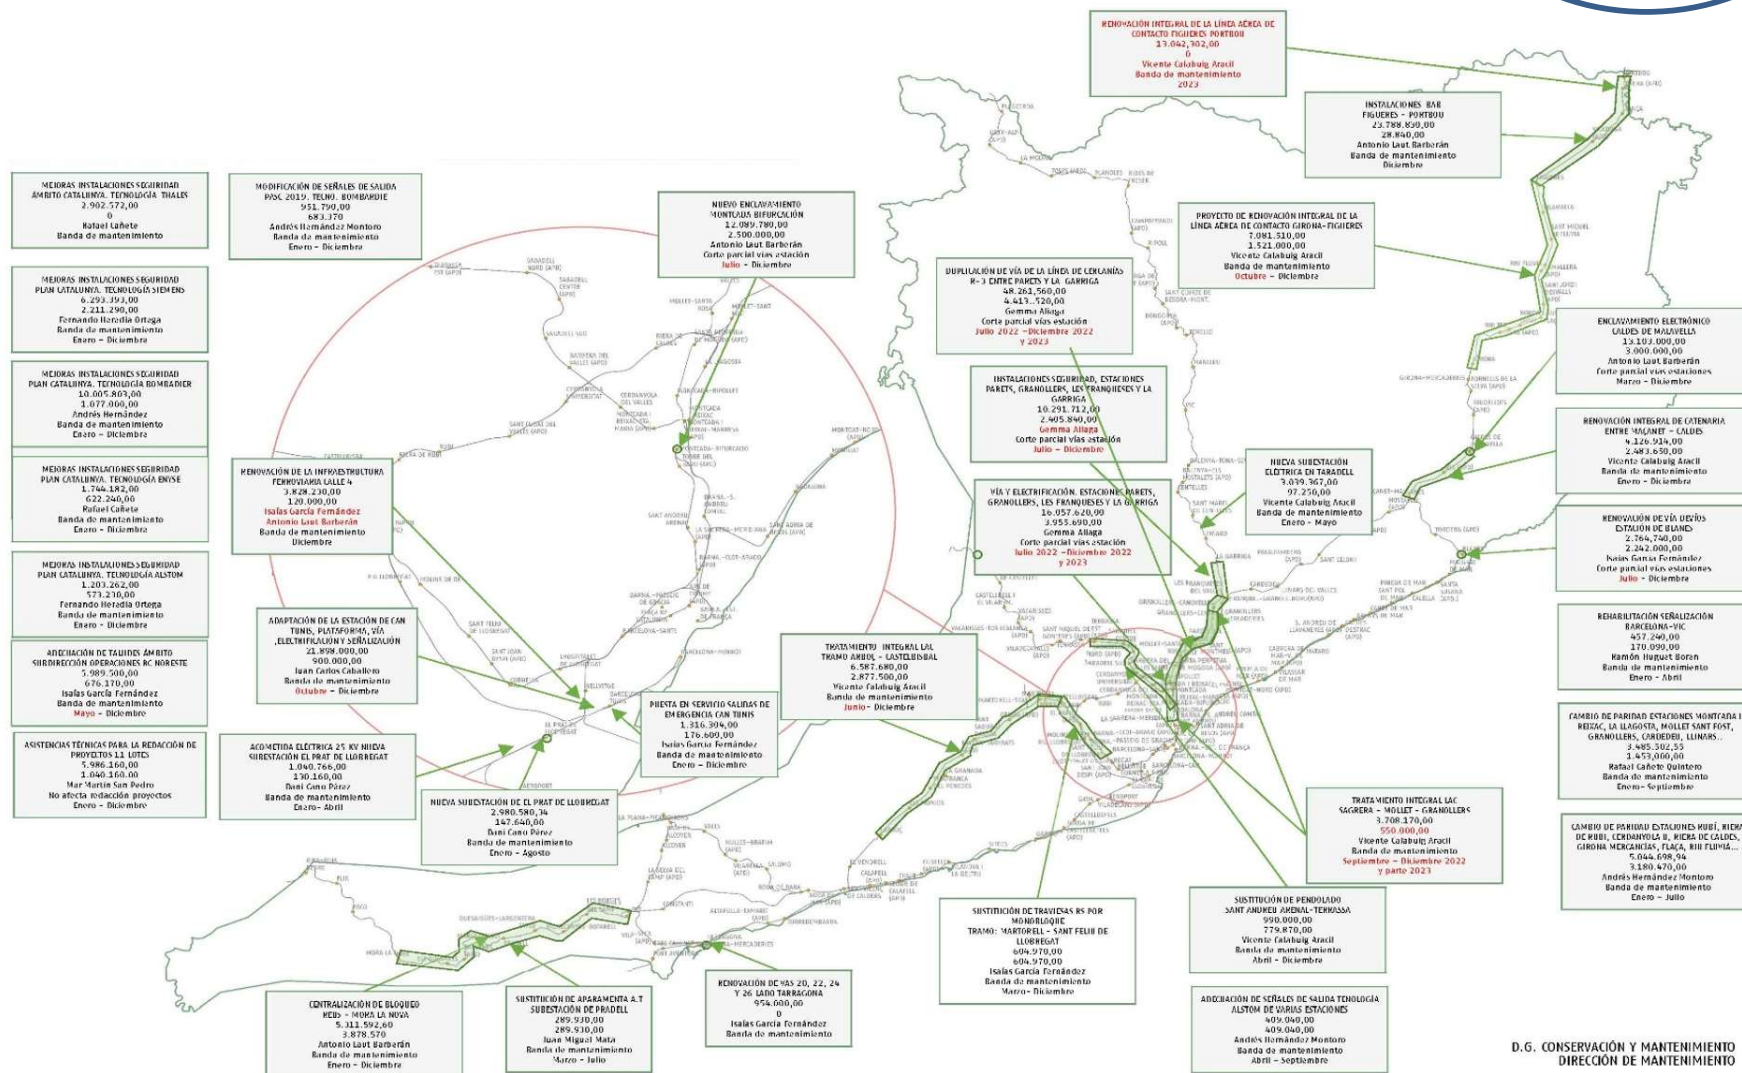

D.G. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



Programa d'atenció al client

Subministrament, instal·lació i
manteniment d'Agent Únic a les estacions

5,99 M€

En execució

Subministrament i instal·lació de lectors de
codis de barres/QR per a validació billets

0,70 M€

En execució

Digitalització de sistemes de seguretat a
les estacions (projecte RS3)

8,70 M€

En execució

Subministrament i instal·lació
d'equipament de xarxa a les estacions

1,51 M€

En execució

Subministrament i instal·lació de pantalles
multimèdia al nucli de Barcelona

5,5 M€

En execució

Renovació cronometria

1,21 M€

En execució

Instal·lacions elèctriques per a sistemes
de informació d'estacions

2,42 M€

En execució

Subministrament, instal·lació i manteniment
d'equipament de control de accessos

5,12 M€

En licitació

Programa de material rodant


Compra de 101 trens de gran capacitat per a Rodalies Autoritzada per CM ampliació contracte a 101 unitats
 Pressupost aproximat Rodalies: 1.170 M€
 En construcció



Remodelació per a fer accessibles tots els trens de la sèrie 447
 Pressupost: 138 M€
 Finalitzat



Instal·lació sistema ERTMS en trens
 Inversió: 39,5 M€
 En execució

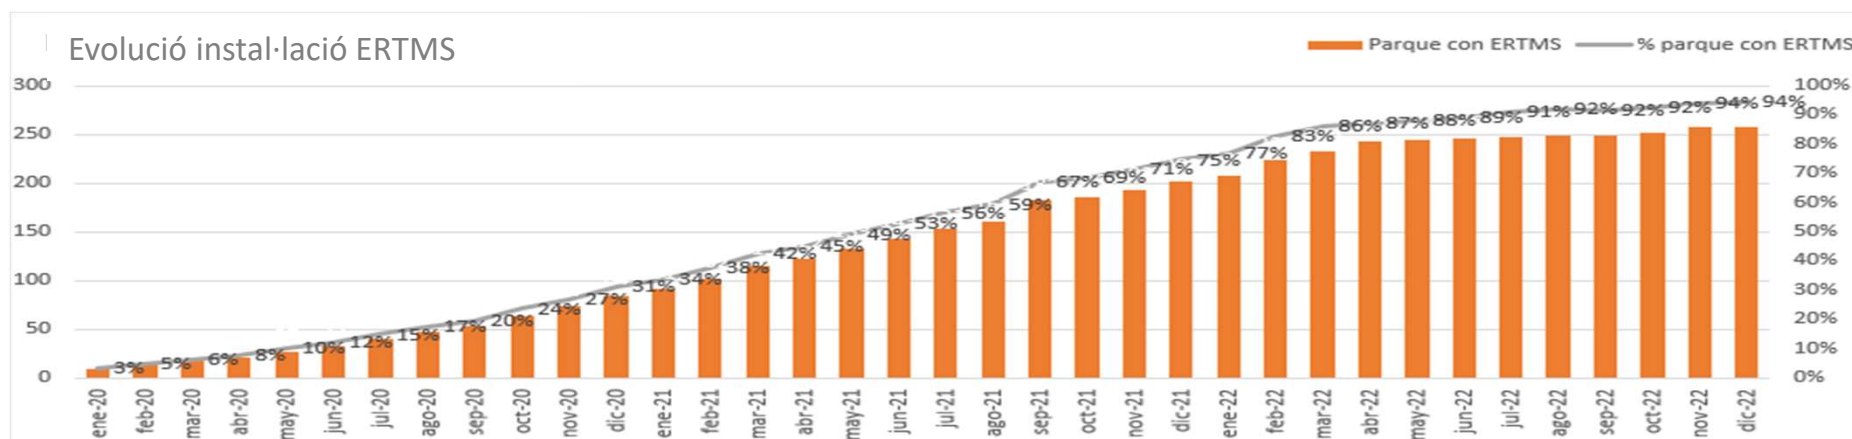



Programa d'avaluació i planificació d'actuacions estructurants

- ✓ Mitma ha contractat l'estudi de **viabilitat** de la remodelació de la **xarxa arterial ferroviària de Tarragona** i ha constituït **una comissió tècnica amb la** presència de les administracions territorials
- ✓ En redacció l'estudi informatiu de la duplicació de via del tram **Vic-Centelles** i el que conté 4 actuacions: estacions tècniques de **Can Boada** i **El Prat de Llobregat**, el salt de moltó d'accés a **Cerdanyola Universidad** i l'enllaç entre la línia del Vallès i la de **Puigcerdà a Mollet-Santa Rosa**
- ✓ Renfe ha inclòs al seu pla de tallers la construcció de **nous tallers a Ripoll, Sant Vicenç de Calders, Maçanet-Massanes i Manresa**. Ha acordat amb l'Ajuntament de **Ripoll** el projecte corresponent
- ✓ Mitma adjudica l'Estudi Funcional de la **nova línia Castelldefels-Cornellà-Barcelona** i l'Estudi Informatiu de **millora de la capacitat i intermodalitat a l'estació de Martorell**
- ✓ Mitma adjudica l'Estudi Informatiu de l'**estació intermodal de Vila-seca - Tarragona**
- ✓ La secretaria general d'Infraestructures ha iniciat contactes amb els Ajuntaments de cara a la planificació de la **quadruplicació de via entre Castelldefels i El Prat de Llobregat**, així com amb l'Ajuntament de **Mollet per a la duplicació de via**
- ✓ L'Oficina de Coordinació del Pla i la Gerència de Rodalies participen en les comissions de l'ATM per a la definició de **programes de Park&Ride i Bicitancats**
- ✓ Mitma licita l'estudi informatiu del **nou ramal ferroviari a Picamoixons**

Imports anuals de contratació i execució del Pla

2020

Licitacions: 121,59 M€

Adjudicacions: 275,18 M€

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020

296,97 M€

Adif	133,35 M€
CorMed	73,22 M€
Renfe	54,40 M€
Sagrera	36,00 M€

2021

Licitacions: 598,11 M€

Adjudicacions: 1.528,48 M€ *

*inclou adquisició de trens per valor de 1.170 M€, part proporcional aproximada per a Rodalies

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021

253,35 M€

Adif	128,72 M€
CorMed	57,13 M€
Renfe	31,38 M€
Sagrera	36,12 M€


2022

(Fins a 31 de desembre, dades provisionals)


Licitacions: 876,63 M€

Adjudicacions: 406,11 M€

Licitació acumulada 31 de desembre 2022

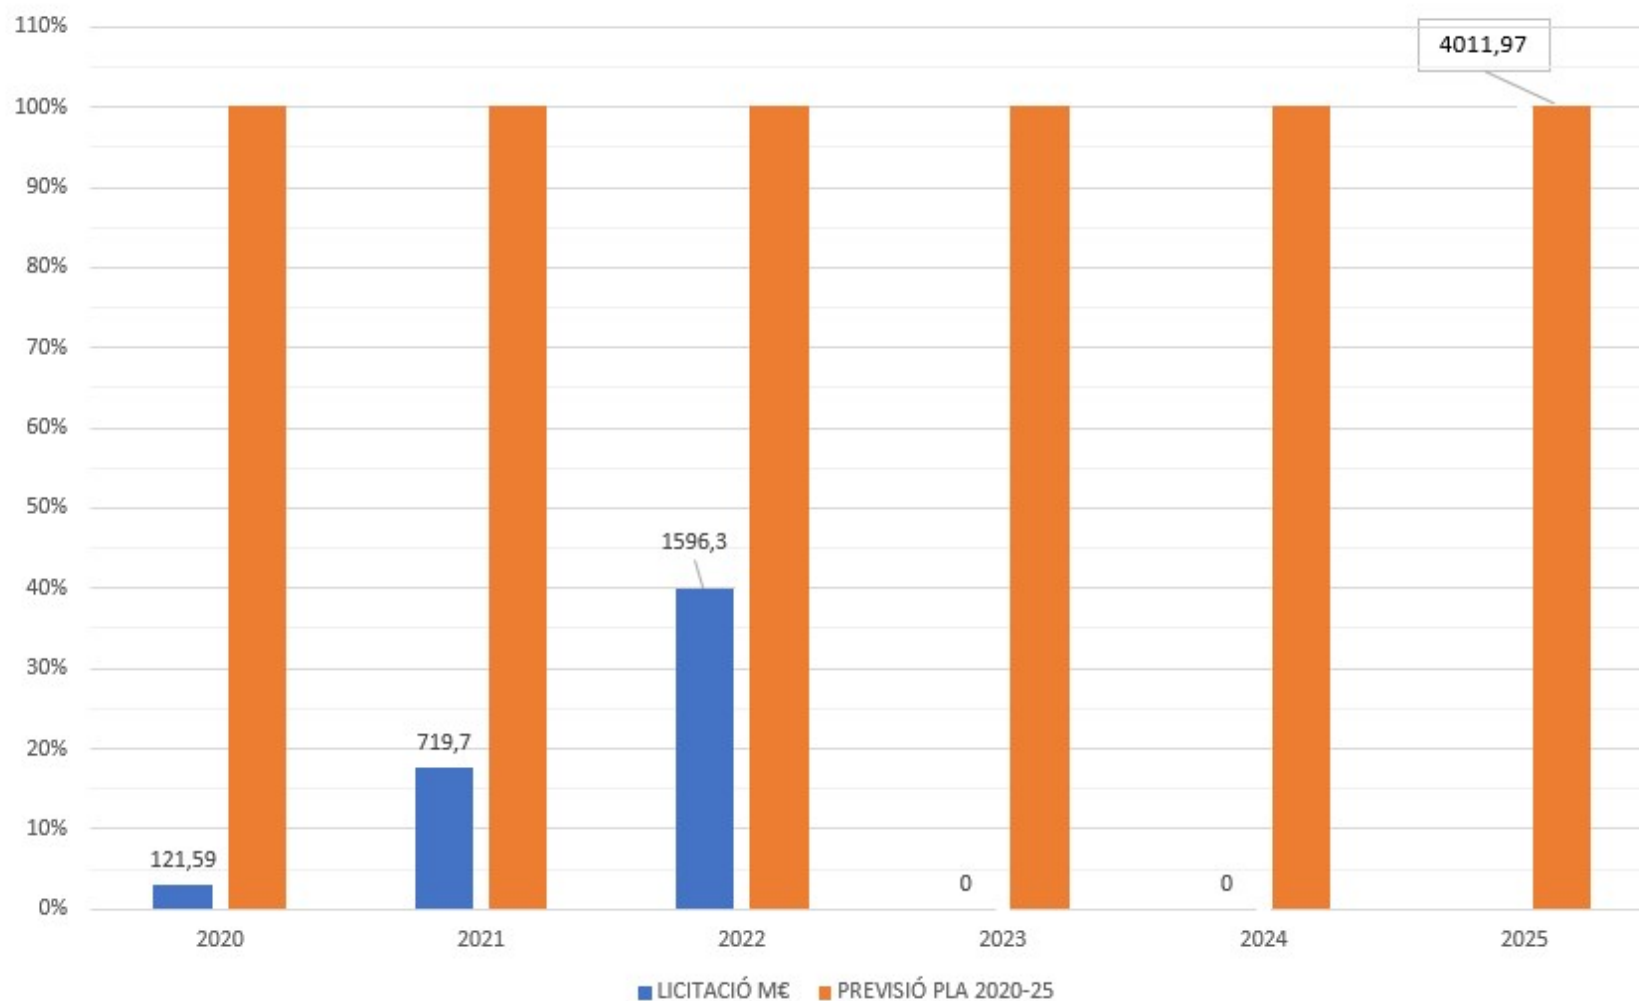

Adjudicació acumulada a 31 de desembre 2022

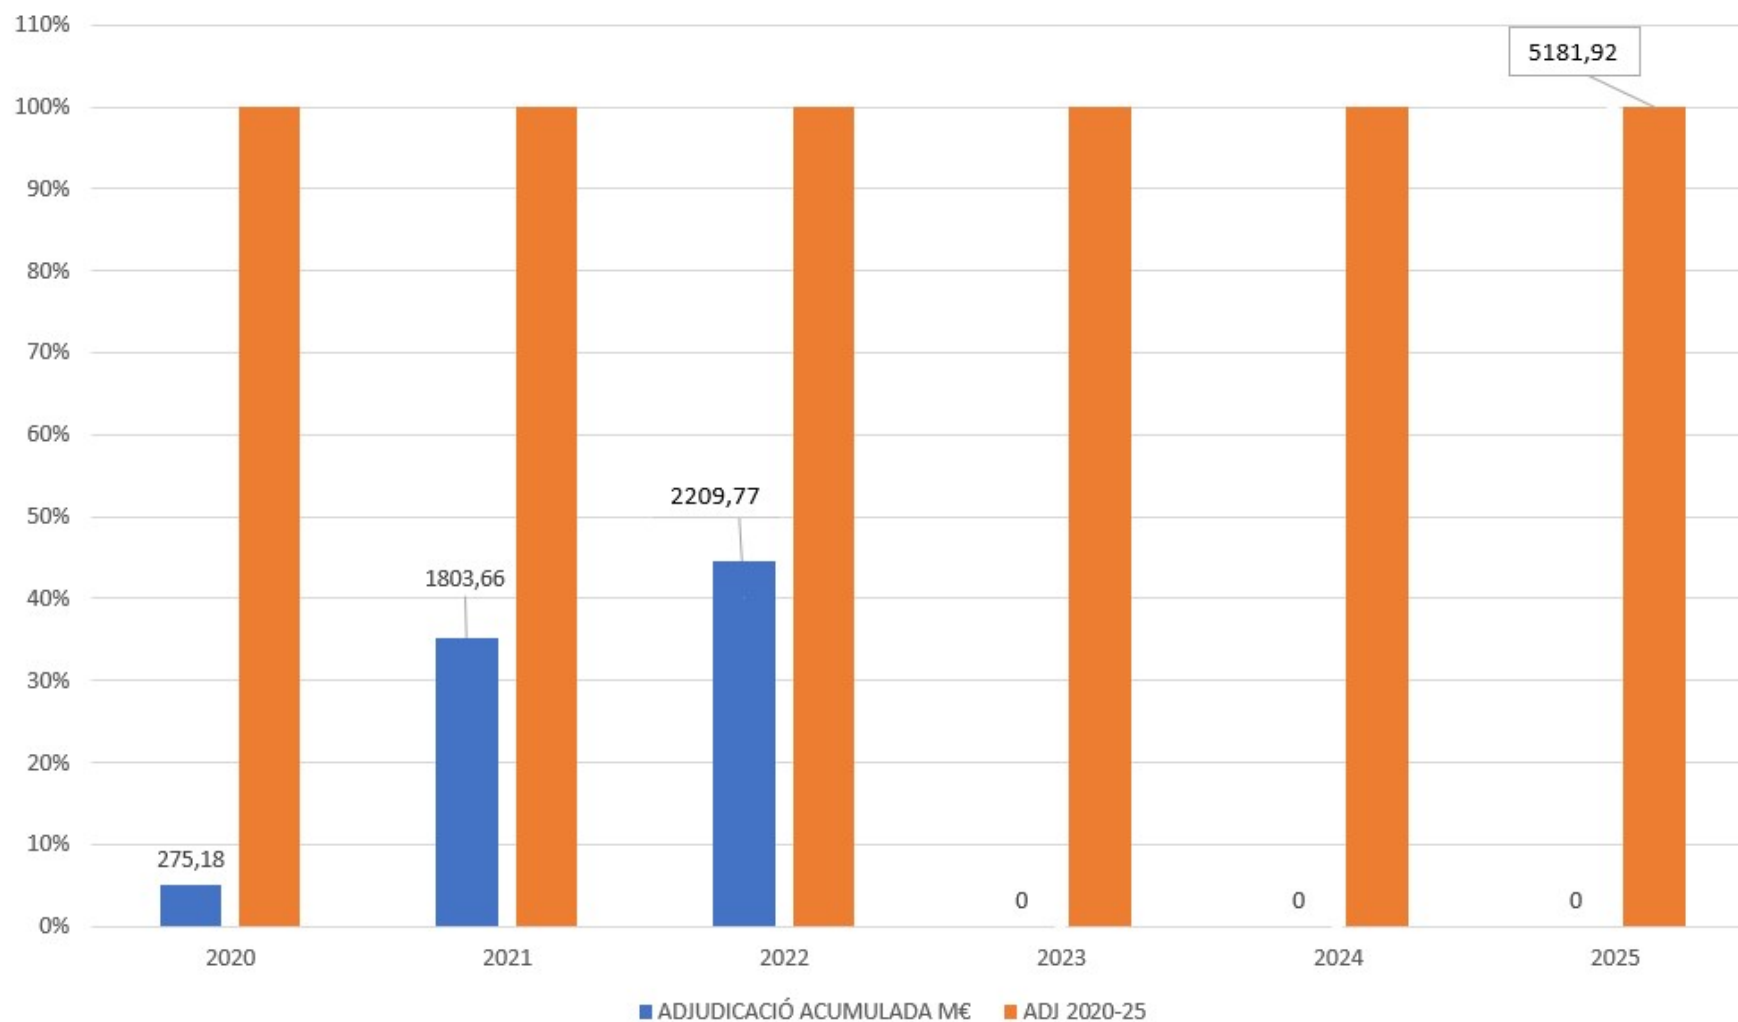



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies de Catalunya



adif



Rodalies
de Catalunya

renfe

Moltes Gràcies!

OFICINA DE COORDINACIÓ DEL PLA DE RODALIES
